



着工前

※着工前・完了後は
同じ角度から撮影のこと。



完了後

※着工前・完了後は
同じ角度から撮影のこと。



安全対策

※仮歩道の設置、車両の
通行規制、工事標識、交
通誘導員配置の状況がわ
かる写真を撮影のこと。



舗装切断状況



掘削深さ

H=

※縁石下貫通部の施工がある場合は貫通部分の写真も撮影のこと。
(えぐり掘りは禁止)



サドル分水栓取り付け

※铸铁管の場合は防食コアの挿入状況も撮影のこと。




穿孔片取り出し



サドル分水栓保温カバー

取り付け

※φ13～25は保温カバー、
φ30以上はスタイロフォーム

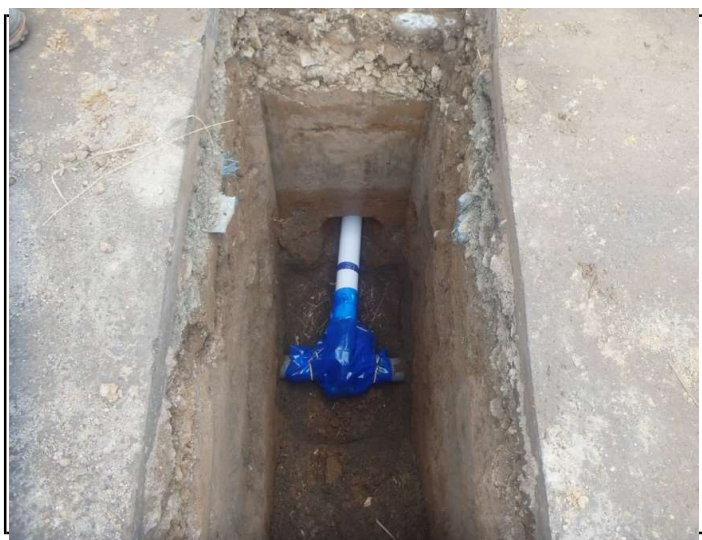

ポリスリーブ及びパイプガード

取り付け



給水管布設状況

L=

※管延長測定



管廻り砂埋戻し、転圧

H=

t=

※管上100mm以上埋戻し。

※施工箇所が2か所以上
(車道・歩道等)ある場合は、
施工箇所ごとに写真を撮影すること。



在来土埋め戻し、転圧

1層目

H=

t=

※1層300mm以下で
埋め戻すこと。



在来土埋め戻し、転圧

2層目

H=

t=

※1層300mm以下で
埋め戻すこと。



凍上抑制層埋め戻し、転圧

1層目

H=

t=

※1層200mm以下で
埋め戻すこと。



凍上抑制層埋め戻し、転圧

2層目

H=

t=

※1層200mm以下で
埋め戻すこと。



埋設標示シート

※現況位置で布設



路盤埋め戻し、転圧

1層目

H=

t=

※1層200mm以下で
埋め戻すこと。



路盤埋め戻し、転圧

2層目

H=

t=

※1層200mm以下で
埋め戻すこと。



仮復旧



舗装影響幅測定



不陸整正

H=



プライムコート塗布

※タックコートの施工がある場合は塗布状況を撮影のこと。



細粒度アスファルト混合物

※舗装が2層以上ある場合は、各層の厚さがわかるよう撮影のこと。



舗装出来形寸法

W=



舗装出来形寸法

L=

